

Kamar Poles Karya Logam (tambah kipas, modif tembok jadi tembuspandang)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat kamar poles untuk moles di lantai produksi barat
- where/dimana: Lantai Produksi barat Timboel
- when/kapan: Januari-Februari 2026
- who/siapa: Pak Qirun, Tim Bangunan
- why/mengapa: Pindah poles ke lantai produksi barat, tapi menjaga agar kotoran poles terpusat
- how/bagaimana: Bikin kamar untuk moles

Checklist

- RAB
 - Kamar Poles
- Pak Kirun koordinasi dengan Kepala Departemen untuk perencanaan zonasi tanggal 03-11-2025
- Garap setelah Ali hHanafi (6 Desember 2025)
- Rencana mulai tanggal 12 Desember 2025
 - Membersihkan lantai dari pengisi
 - Pak Kharji akan buang mal
- Desain

- Naufan remake desain lantai di masa lalu
- Jalan utama 2 meter karena untuk menambah luas area kerja
- Pak Qirun diskusi dan rancang dengan kepala divisi produksi mengenai pembagian lantai
- Naufan desain boks steril untuk poles dan finishing
- Konstruksi
 - Lantai
 - Tembok
 - Atap
 - Kipas angin
 - x] filter
 - antri pembelian
 - listrik
 - pencahayaan
- Kelengkapan
 - PPE
 - Masker
 - Sarung tangan kulit
 - pelindung telinga
 - Kacamata kulit
- Tambah kipas 3 unit
 - daftarkan belanja
- Modifikasi dinding selatan jadi tembus pandang
 - daftarkan belanja

Catatan Keputusan

Pak Qirun 23-4-26 perihal modifikasi

- Tambah kipas 3 pcs (dan kebutuhan pemasangannya)
- tembok selatan diganti jadi mika tembus pandang supaya bisa diindik kerjanya dari luar

Magistyoyo dan Pak Kirun 11-3-2026

- pakai pintu engsel 2 besar untuk kemudahan konstruksi
- lokasi apd dan alat di luar ruangan untuk nambah luas ruang poles, tidak ada ruang buffer
- pintu pakai bahan transparan (polycarbonat yg dipakai atap)
- brlanja arap polcarbonat dulu baru kilas fan dakron
- cat putih dinding supaya permukaan tembok halus

Diskusi 1330 5-1-2026

- Atap kamar poles pakai fiber transparan
- Akan digarap per part konstruksi supaya bisa kontrol pengeluaran

Pak Qirun Magisty 3-1-2025

- Gorong gorong tidak jadi diisi, tapi ditutup saja pakai tutup cor beton/semen

Pak Qirun, Mbah Tembong 2-1-2025

- Gorong-gorong ditutup penuh, diisi dan tidak digunakan lagi
- estimasi 15 hari kerja

Magis on Boks Steril Poles

- Bikin boks steril untuk proses poles ukuran 2+1 kuda. Terdiri dari dua bilik:
 - Bilik transisi: untuk menaruh APD, alat kebersihan, dan tempat proses poles apabila dibutuhkan
 - Bilik poles: untuk proses poles
- Bilik Transisi lokasinya di antara luar boks dan bilik poles (intermediet)
- Ventilasi: kasih outlet sirkulasi udara mdengan fitur kipas dan filter untuk buang angin keluar di atas. Kasih inlet angin dengan filter di bawah. Filter menggunakan KAIN DAKRON.
- Material menggunakan bahan sisa, ditambah dengan expanding foam (sekali pakai, ditandai dulu yang mau di-foam)
- Tidak boleh ada ganjalan di jalur perpindahan barang

Pak Qirun dan Kru Gambar 24-12-2025

- Kamar ganti dan loker pegawai ada di selatan untuk menghindari bledug dan hemat bahan. Kantor poles akan ditaruh jauh dari finishing

- Jalan di divisi finishing diubah dari 1 meter jadi 1.5 meter untuk memperluas area gerak finishing dan pembatas antara finishing gloss dan finishin non gloss
- Supaya hemat, akan diwarnai pakai cat sisa dulu.

1330 Planning piroritas pengadaan area kerja/karyawan

- Tempat ganti salin karyawan
- Tempat poles KL
- Boks steril mas supri

ADD ON saran Pak Qirun tanggal 24-12-2025

- Pindah tutup gorong-gorong lantai produksi tengah ke barat untuk tutup gorong-gorong. Gorong-gorong Produksi Tengah ditutup karena mayoritas produksi akan dipindah ke barat semua, pengguna gorong-gorongnya jadi sedikit

Diskusi Pak qirun dan mas magis 18-12-2025

- Ruang barang parsial di rencana sebelumnya diganti jadi ruang untuk raised bed/pot pohon
- kantor karya logam dibagi menjadi beberapa area menggunakan sekat kayu setinggi 60-80 cm supaya meningkatkan tingkar organisasi karyawan

Diskusi Pak Qirun 17-12-2025

- Pakai cat isamu merah karena bisa dipakai menggunakan spray contoh keputusan: # (Untuk IFEX 1995, karena IFEX 1994 booth terlalu kecil, booth 2025 diputuskan menjadi 24m2. Harga sewa kan lebih mahal tapi ukuran besar jadi bisa bawa barang lebih banyak)


Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- RAB Kamar Poles
 - RAB Poles

- Referensi Sterile box

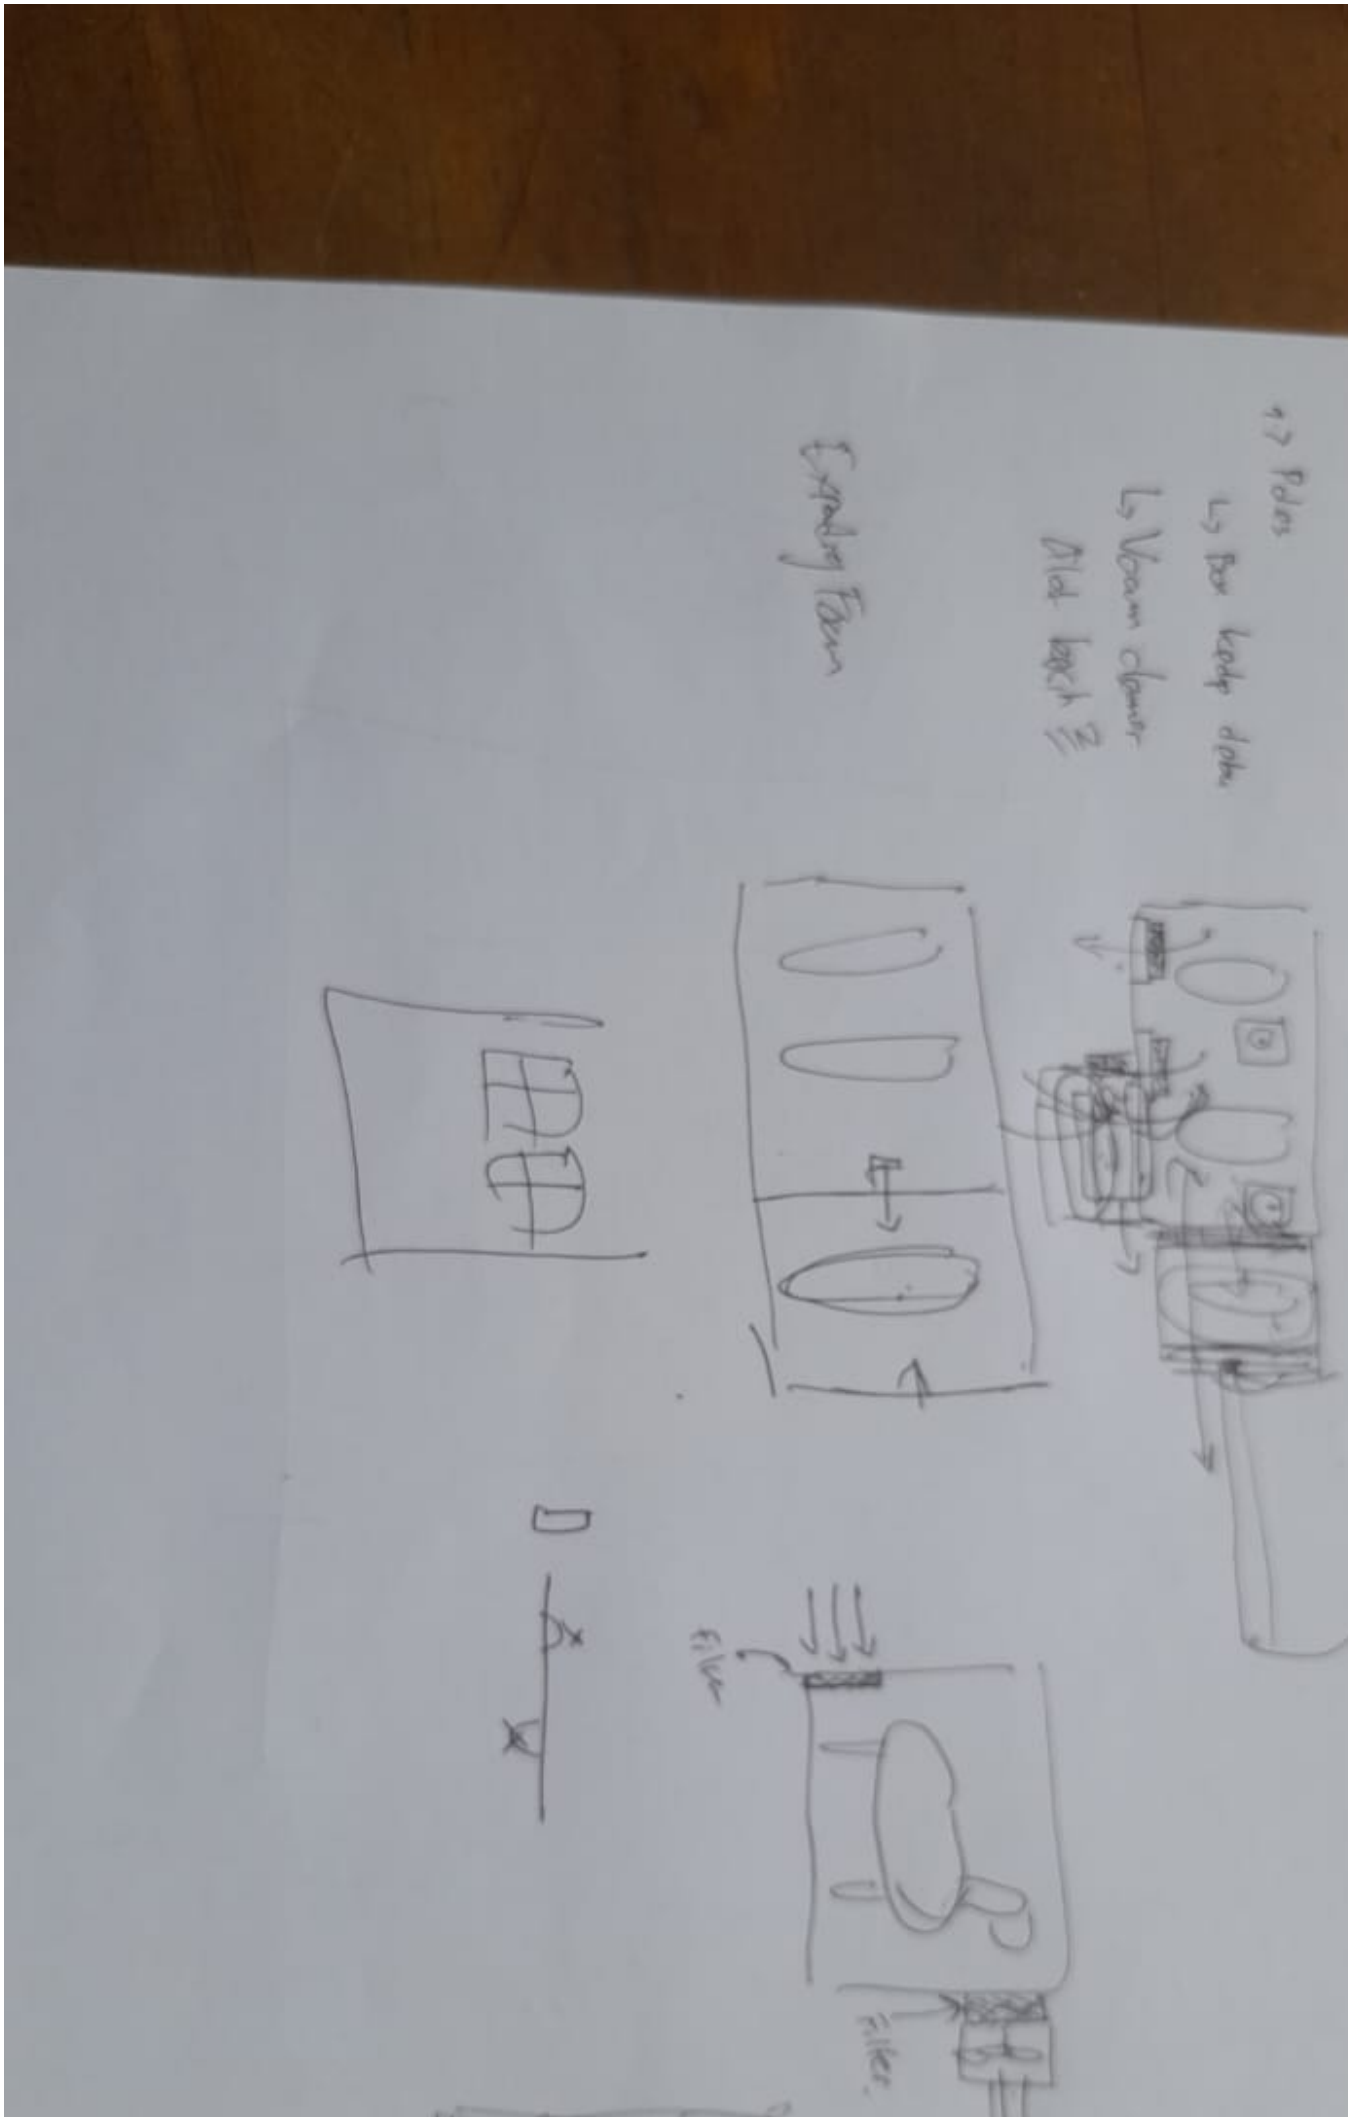

- Daftar dokumen yang dibutuhkan project
-

Revisi #10

Dibuat 14 Januari 2026 07:57:58 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 23 April 2026 06:15:18 oleh fadhilanaufan
