(Splitted) Planning Lantai Produksi

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Pak Kirun
- where/dimana: Lantai Produksi Timboel
- when/kapan: Mulai tanggal 3-11-2025
- who/siapa: Pak Kirun dan kepala departemen
- why/mengapa: Untuk penataan lantai produksi
- how/bagaimana: Diskusi kebutuhan, zonasi

Checklist

☑ RAB

- ☑ Tembok partisi Karya Logam
- ☑ Kamar Poles
- ☑ Gorong-gorong

☑ Pak Kirun koordinasi dengan Kepala Departemen untuk perencanaan zonasi tanggal 03-11-2025

☑ Garap setelah Ali hHanafi (6 Desember 2025)

☑ Rencana mulai tanggal 12 Desember 2025

- ☑ Membersihkan lantai dari pengisi
- ☑ Pak Kharji akan buang mal

☑ Desain

- ☑ Naufan remake desain lantai di masa lalu
- ☑ Jalan utama 2 meter karena untuk menambah luas area kerja
- ☑ Pak Qirun diskusi dan rancang dengan kepala divisi produksi mengenai pembagian lantai

- ☑ Naufan desain boks steril untuk poles dan finishing
- ☐ Drawing (23-12-2025)
  - ☑ tandai zona dengan cat isamu merah
    - ☐ Prioritas pengadaan area: ~~tempat ganti~~, tempat poles KL, boks steril mas supri
  - ☑ Pindah grate/tutup gorong-gorong dari lantai tengah untuk tutup gorong-gorong lantai barat supaya tidak perlu lompat kali saat perpindahan barang/manusia
    - ☐ ~~Butuh filler penutup pasir semen~~
    - ☐ Bikin tutup cor gorong-goron
- ☐ Konstruksi
  - ☐ Kamar poles
  - ☐ Gorong-gorong
  - ☐ Partisi Karya logam
-

Catatan Keputusan

Diskusi 1330 5-1-2026

- Atap kamar poles pakai fiber transparan

Pak Qirun Magistyo 3-1-2025

- Gorong gorong tidak jadi diisi, tapi ditutup saja pakai tutup cor beton/semen

Pak Qirun, Mbah Tembong 2-1-2025

- Gorong-gorong ditutup penuh, diisi dan tidak digunakan lagi
- estimasi 15 hari kerja

Magis on Boks Steril Poles

- Bikin boks steril untuk proses poles ukuran 2+1 kuda. Terdiri dari dua bilik:
  - Bilik transisi: untuk menaruh APD, alat kebersihan, dan tempat proses poles apabila dibutuhkan
  - Bilik poles: untuk proses poles

- Bilik Transisi lokasinya di antara luar boks dan bilik poles (intermediet)
- Ventilasi: kasih outlet sirkulasi udara mdengan fitur kipas dan filter untuk buang angin keluar di atas. Kasih inlet angin dengan filter di bawah. Filter menggunakan KAIN DAKRON.
- Material menggunakan bahan sisa, ditambal dengan expanding foam (sekali pakai, ditandai dulu yang mau di-foam)
- Tidak boleh ada ganjalan di jalur perpindahan barang

Pak Qirun dan Kru Gambar 24-12-2025

- Kamar ganti dan loker pegawai ada di selatan untuk menghindari bledug dan hemat bahan. Kantor poles akan ditaruh jauh dari finishing
- Jalan di divisi finishing diubah dari 1 meter jadi 1.5 meter untuk memperluas area gerak finishing dan pembatas antara finishing gloss dan finishin non gloss
- Supaya hemat, akan diwarnai pakai cat sisa dulu.

1330 Planning piroritas pengadaan area kerja/karyawan

- Tempat ganti salin karyawan
- Tempat poles KL
- Boks steril mas supri

ADD ON saran Pak Qirun tanggal 24-12-2025

- Pindah tutup gorong-gorong lantai produksi tengah ke barat untuk tutup gorong-gorong. Gorong-gorong Produksi Tengah ditutup karena mayoritas produksi akan dipindah ke barat semua, pengguna gorong-gorongnya jadi sedikit

Diskusi Pak qirun dan mas magis 18-12-2025

- Ruang barang parsial di rencana sebelumnya diganti jadi ruang untuk raised bed/pot pohon
- kantor karya logam dibagi menjadi beberapa area menggunakan sekat kayu setinggi 60-80 cm supaya meningkatkan tingkar organisasi karyawan

Diskusi Pak Qirun 17-12-2025

- Pakai cat isamu merah karena bisa dipakai menggunakan spray

Jadwal (opsional)


- [ ] Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- [ ] Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- RAB pembatas karya logam
  - RAB pembatas
- RAB Kamar Poles
  - RAB Poles

- Referensi Sterile box

- Mapping raw

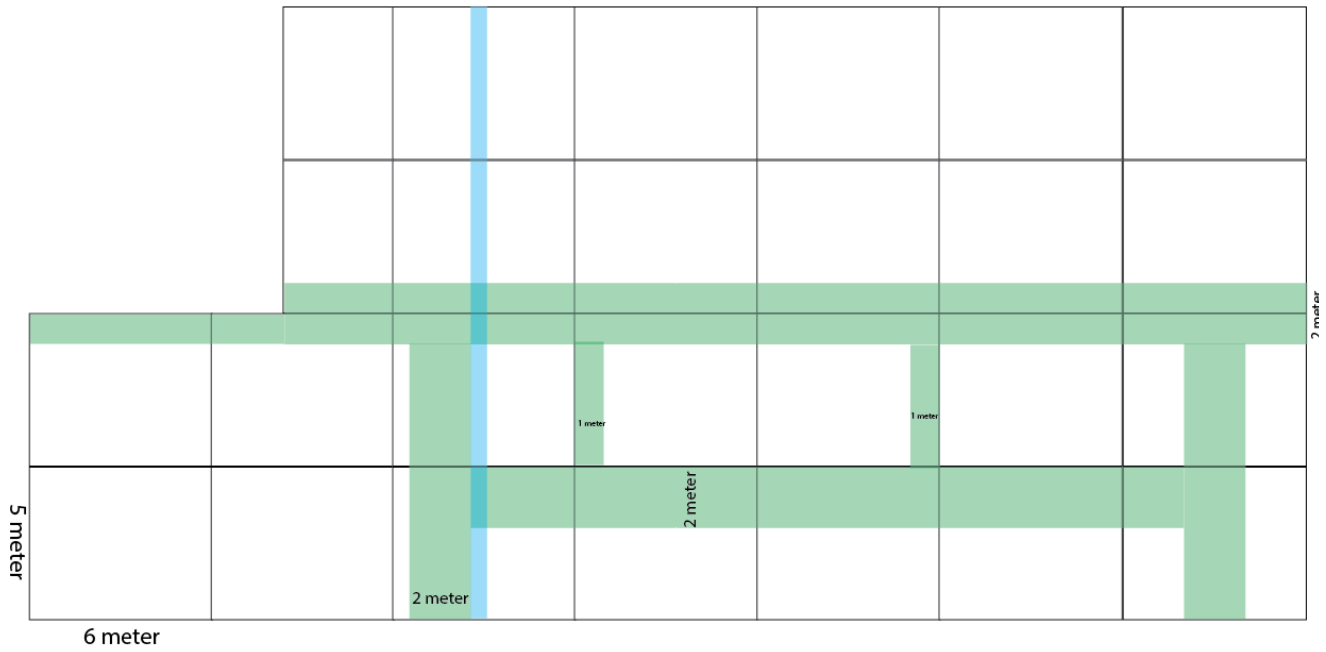

Revisi #35
Dibuat 3 November 2025 08:14:51
Diperbaharui 15 Januari 2026 03:47:17
