

# Manusia Purba (pembayaran)

---

nama: Manusia Purba

type: custom order

status: Selesai pasang (24 Des 2025)

dibuat: 2025-09-08

deadline: 2025-12-20

---

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Proyek pemda sragen
- where/dimana: di sragen jawa tengah
- when/kapan: dipasang max tgl 24 Des 25
- who/siapa:
  1. kontraktor CV Widya Bakti Utama
  2. Bapak Anto sebagai direktur CV Widya Bakti Utama (+62 812-2790-7572)
  3. Bapak Andreas sebagai kepala bidang DPU Pemda Sragen (+62 813-2731-1500)
  4. Mas Daniel sebagai arsitek perencana (+62 812-1503-8741)
  5. Mas Harits sebagai pengawas proyek
  6. Ibu Anjar sebagai staf kebudayaan Sragen (+62 851-7311-1318)
  7. Pak Made sebagai konsultan seni
  8. Bu Nunuk staf WBU (+62 889-8068-1239)
  9. Pak Andang staf WBU
- why: Dibuat tinggi 4 meter sebagai landmark/monumental kantor pemda sragen

## Checklist

- Revisi penawaran harga fixed 2 patung cubism.
- Acckan sketsa sabtu, 27 Sept 2025.

- Kunjungan ke Sangiran untuk cek style gambar untuk patung (Nyana, Supri, Gomar, Sofia (opsional)).
- Diskusi bersama Bupati Sragen pada tanggal 15 Oktober 2025.
- Buat penawaran harga terbaru 4 meter dengan harga final Rp675.000.000.
- Buat penawaran harga terbaru 4.5 meter dengan harga final Rp720.000.000.
- Kirim 2 penawaran terbaru ke pak Anto hari kamis, 16 Oktober 2025.
- Kirim hardcopy penawaran ke DPU Sragen dan Kantor Perencana di Solo hari Kamis, 30 Oktober 2025.
- Model
  - Revisi muka (Pak Bupati)
  - Revisi senjata (Bu Anjar)
- Moulding (proses) 26-27 november sudah kirim ke Habib
- Mentah
  - Cor mas habib ngalir per part yang sudah selesai cor
- Rangkai (tanggal 13 Desember selesai)
  - Argana dan Karya Logam
- Finishing
  - Maryanto finish 4 hari karena butuh proses pengeringan
  - Cari cara untuk membuat BST tahan lama/mudah perawatan
  - (NYANA) Tanya ke kontraktor sana apakah bisa menyediakan pasir dan semen untuk instalasi
    - yang beli Timboel
- Packing
- Delivery
  - Pengiriman pakai potong 1 tangan karena agar bisa muat truk
- Install
  - butuh pasang tangan dulu, jadi butuh jauh hari (19 Desember berangkat) karena proses sambung tangan lama dan finishing
  - Pengerjaan cor base manusia purba
- Memberikan Fee ke arsitect(Daniel)

## Jadwal

- 30 September 2025 ke Sangiran

- 15 Oktober 2025 diskusi bersama Bupati Sragen
- 3 November 2025 Follow Up Pak Anto result: hari senin 3 november 2025 pak anto dan timnya sedang proses CCO di pemda sragen.
- Pak Qirun: client diundang datang tanggal 12-13 November 2025 atau nanti pengiriman mundur
- 13 November 2025 akan ada kunjungan dari kontraktor, DPU, perencana, Bu Anjar, pak Bupati.
- 19 November 2025 mas Nyana berkunjung untuk meminta tanda tangan Pak Andreas
- 18 Desember 2025 memastikan pustek sudah terpasang sesuai spesifikasi sebelum patung berangkat
- 19 Desember 2025 berangkat
- 24 Desember 2025 patung terpasang di kantor pemda sragen
- Senin, 15 Desember 2025 menagih invoice 70% pembayaran

## Hasil Rapat (opsional)

15 Mei 2026

Masa retensi berlangsung sampai Juli 2026, pembayaran biaya retensi setelah Berita Acara Serah Terima 2.



## 1330 29-12-2025

- Bonusnya dari Mas Magis untuk kru purba akan diamplopi
- Dikasih bersama slip gaji, dalam cash (31 desember 2025)
- round down pecahan 1000

## Pak Qirun Mas Margono Nyana tentang kebutuhan pemasangan di lokasi (13-12-2025)

- Scaffolding 4 set (akan disiapkan pak Anto)
- Pasir 1 kol semen 10 sak split 0.5 kg obat semen 5 kg Barang selain scaffolding akan disiapkan oleh Timboel

# Rapat 2025-10-27

- Belum ada down payment karena Pak Anto masih akan mengajukan ke pemda
  - Sofia: solusinya memperingatkan Pak Anto bahwa kalau harganya kena nego, yang dikurangi terlebih dahulu adalah komisi Pak Anto karena harga Timboel sudah fixed.
  - Follow up ke Pak Anto

# Rapat 2025-10-15

- untuk pedestal: bikin template cakar ayam untuk konstruksi sragen
- menentukan ukuran pedestal. dipepetkan dengan kaki mas purba
- Pak gomar bikin gada. foto maket final
- cetak foto manusia purba gada versi lama
- guratan otot-otot lebih diperlihatkan
- bentuk muka sudah oke (maket purba bawa gada)
- warna finishing terkonfirmasi black silver TP
- base patung menggunakan plat besi untuk di dynabolt ke pedestal (perlu diskusi lebih dalam apakah kuat atau tidak)
- pandangan mata patung tajam ke depan
- Harga patung 5 meter harga awal 520 -> batas akhir 475
- Harga patung 4 meter harga awal 470 -> batas akhir 425

# Decision 2025-10-17

- Ukuran patung yang disetujui oleh pemda sragen adalah 4 meter. Terkonfirmasi dari pak Anto.
- Rekomendasi tinggi pedestal 100 cm

# Important note 2025-11-03

- Kirimkan foto-foto model yang sudah jadi 100% ke bu Anjar arkeolog. Kirim statement bahwa model yang dibuat sudah sesuai dengan request pak Bupati Sragen. Lalu minta pendapatnya bu Anjar.
- Undang pihak kontraktor, perencana, DPU Sragen, dan bu Anjar arkeolog. Jika memungkinkan, undang juga pak Bupati Sragen untuk melihat langsung model 4 meter yang sudah jadi 100%. Mintakan acc, ada ataupun tidak ada revisi. Acc terdokumentasi dengan dibubuhi tanda tangan pihak PT Timboel dan perencana.
- Proses produksi akan tetap dilanjutkan sampai cetak fiber. Jika DP tidak terkonfirmasi masuk sampai tahap ini maka proses produksi selanjutnya (repro) tidak akan dilanjutkan.
- Konsekuensi jadwal pemasangan patung mundur akibat dari tidak lancarnya proses pembayaran menjadi tanggungjawab kontraktor. PT Timboel tidak berkewajiban

menanggung denda keterlambatan.

- Patung akan dikirim ke lokasi pemasangan jika DP sebesar 90% sudah terkonfirmasi masuk ke akun PT Timboel.

# Kunjungan Bupati Sragen dan rombongan 13 Nov 2025

- Revisi on the spot pada alis dibuat menyambung kanan-kiri dan bentuk alat bantu genggam.
- Alis sudah direvisi dan sudah di acc on the spot oleh bu Andjar dan pak Bupati Sragen.
- Alat bantu genggam bentuk diubah menjadi tulang paha gajah purba.
- Dokumen progres produksi sudah ditandatangani di ruang modeling oleh mas Magis dan pak Andreas DPU Sragen dengan hasil dilanjutkan dengan revisi minor. Dokumen persetujuan dapat dilihat di sini [LINK DOC](#).

## Diskusi 2025-11-14 Nyana-Margono

- Untuk pemasangan patung pakai metode tanam holo
  - Patung akan diberi rangka base menggunakan besi holo sesuai dengan kebutuhan
  - Saat pemasangan, bagian rangka base holo akan ditanam ke dalam base patung di Sragen sehingga kekuatan berdirinya lebih baik
  - Manfaat lainnya, finishing bisa dilakukan dengan posisi patung berdiri sehingga mempermudah aplikasi cat

## Rapat 1330 2025-11-18

### Perihal finishing BST

- BST sesuai dengan proposal pengajuan ke pemerintah. Jadi nanti bisa habis waktu banyak kalau revisi
- Kenapa Pak Qirun bikin sampel
  - Untuk alternatif warna selain BST yang rawan

### Keputusan

- Manusia Purba tetap menggunakan finishing black silver tipis karena proposalnya tertulis finishing black silver
- cari cara untuk memperkuat bst (Pak Qirun)

# Important note 2025-11-04

- DP 20% sebesar Rp135,017,500 terkonfirmasi masuk ke akun PT Timboel

PEND	KR OTOMATIS LLG-DANAMON NUNUK DEWI PRABAND DP PENGADAAN PATUNG	0938	135,017,500.00 CR
------	--	------	-------------------

## Kunjungan ke DPU Sragen 19 November 2025

- Sudah dapat tanda tangan resmi dari pak Andreas kepala bidang cipta karya DPU Sragen dan pak Anto direktur CV Widya Bakti Utama selaku kontraktor. Dokumen persetujuan bisa dilihat di sini [LINK DOC](#)
- Presentasi struktur base hollow dan teknis pemasangan patung di atas base beton sudah disampaikan dengan baik. Pihak kontraktor dan DPU Sragen sudah paham dengan strukturnya.
- Masukan dari pak Herawan staf bidang cipta karya DPU Sragen, besi hollow jika memungkinkan diganti dengan besi beton dengan pertimbangan bahwa besi beton lebih kuat dan bentuknya yang pejal meminimalisir udara terjebak di dalam cor, meminimalisir korosi. Masukan akan ditindaklanjuti bersama pak Kirun dan mas Margono jika sudah pulang dari Solo.

## Kunjungan ke lokasi pemasangan patung 5 Desember 2025



Mal posisi kaki di atas base beton.



Jarak antar tiang besi bagian belakang dan depan 32 cm (total ada 5 tiang besi di depan dan belakang)




Jarak antar tiang besi bagian samping kanan dan kiri 13 cm (total ada 10 tiang besi di kanan dan kiri)

## BERITA ACARA / MOM

Pada hari ini; Jumat, 05/12/2025  
Dengan mengambil tempat di lokasi Tempat Patung,  
Proyek Pemda Terpadu Tahap 3 Kab. Stagen  
Dihiasi oleh : PT. Timboel : P. Pintak  
P. Margono

CV. WBU : P. Arif  
P. Aris  
P. Ari


- (1) PT. Timboel sudah mengoal lokasi tempat  
pudhan patung dan sudah sesuai dengan  
footplate on PT. Timboel, dan sudah kuat
- (2) Pemasangan Patung oleh PT. Timboel di 22 Des 25
- (3) Cor footplate & Kaki (sisi betis kaki) oleh PT. Timboel  
cor Betis by PT. Timboel





- (4) ~~cor~~ Sany Patung on Besi Beton 4  $\varnothing$  12 mm & footplate  
Besi Beton D 14 mm


Demikian MOM ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Stagen; 5 Des 2025

  
5/12/25  
CV. WBU

  
ARIS  
CV. WBU

  
Nyana.P  
PT Timboel

  
MARGONO  
PT Timboel

Berita acara kunjungan ke lokasi pemasangan

# Ganagn ke Pak kirun

- segitiga di frame cor nggak bisa di pasang

## Kebutuhan pemasangan patung

- Semen 10 sak
- Pasir 1 colt
- Batu split 0.5 colt
- Obat cor 5 kg
- Tiang bambu qty menyusul
- Scaffolding 4 set
- Crane kapasitas 3 ton untuk 2 hari
- Tenaga argana las 7 orang
- Finishing 2 orang
- Driver armada timboel 2 orang

## Catatan Keputusan Sabtu, 20 Desember 2025

Catatan ini hasil dari diskusi di Tanli antara Mas Magis, Mba Sofia, dan Nyana.

- Jika maksimal hari Senin, 22 Desember dana Rp200,000,000 masuk ke akun PT Timboel maka patung akan diberangkatkan hari Senin saat itu juga.
- Personil berangkat full team (ada di atas) ditambah Mas Magis dan Mba Sofia.
- Mas Magis, Mba Sofia, dan Nyana diskusi dengan Pak Ronald WBU dan Kepala Cabang Bank Jateng Sragen terkait penyelesaian pembayaran balance patung manusia purba.
- Patung berangkat ke Sragen **TETAPI TIDAK DIPASANG**. Patung dipasang setelah ada kepastian pembayaran dari diskusi bersama kacab bank Jateng Sragen.
- Selama patung tidak dipasang, tim pemasangan tidak boleh berada di area kantor terpadu Pemda Sragen.

## Laporan Pemasangan Patung

- Senin, 22 Desember 2025 tim baru mulai bongkar packing pukul 18:00 wib setelah mendapat konfirmasi pemasangan dari Mas Magis.

Target:

1. Bongkar packing (tercapai)
  2. Pemasangan tangan kanan (tercapai)
- Selasa, 23 Desember 2025 tim bekerja dengan target:
    1. Merapihkan sambungan tangan kanan (tercapai)
    2. Merapihkan sambungan dada (tercapai)
    3. Menyambung footplate dengan cara di las dengan besi angkur dumpal beton (tercapai)
    4. Melakukan pekerjaan pengecoran base (tercapai)
  - Rabu, 24 Desember 2025 tim bekerja dengan target:
    1. Melakukan pekerjaan finishing sambungan tangan dan dada (tercapai)
    2. Melakukan pekerjaan pengecoran bagian dalam kaki patung sampai betis (tercapai)
    3. Melakukan pekerjaan finishing sambungan betis (tercapai)
    4. Meminta kontraktor untuk meninjau hasil pekerjaan (tercapai)
    5. Meminta tanda tangan persetujuan pak Anto bahwa pekerjaan pemasangan patung telah selesai dan disetujui tanpa revisi (tercapai)

Lembar persetujuan dapat dilihat di sini [LINK DOC](#).


NOTE:

1. Biaya retensi akan dibayarkan setelah serah terima 2 (-+ 6 bulan dari sekarang).
2. Fee arsitek, mas Daniel sebesar Rp5.000.000 akan diproses soon.

## Lampiran (opsional)

- Konsep rangka base patung purba

2 Desember 2025.

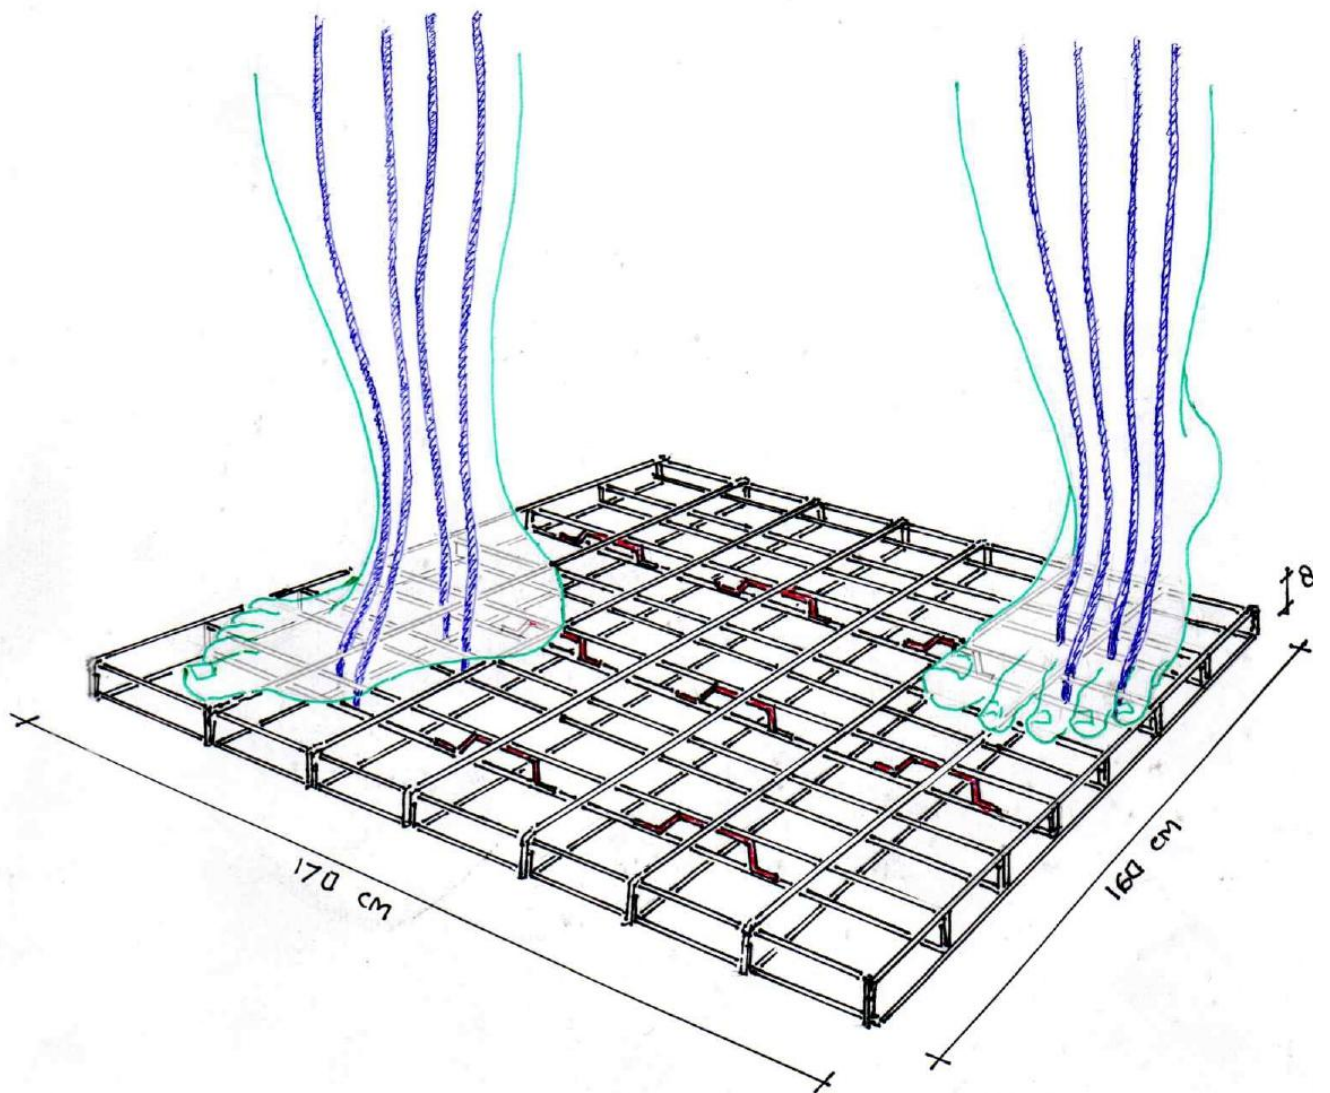

- Foto pembangunan base di lokasi proyek (28 November 2025)  
Ukuran base panjang 2 m x lebar 2,1 m x tinggi 1 m






Tirto, RT 006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul D.I. Yogyakarta 55184  
Office : (0274) 281 7863 E-mail : pttimboel@gmail.com  
Show Room : (0274) 646 3615 magistyo@pttimboel.com  
WA : 085712851773 NPWP : 21.132.897.6-543.000

### Penawaran Patung Manusia Purba

Kepada  
Yth,  
Bapak Anto  
CV Widya Bakti Utama

Salam sehat, terkait dengan diskusi awal untuk pembuatan patung manusia purba. Sesuai gambar referensi terlampir, berikut kami sampaikan penawarannya :

Nama	Foto Referensi	Ukuran	Finishing	Material	Harga
Manusia purba monumental		Tinggi 400 cm	Black Silver TP	Aluminum	Rp593,200,000
<b>Total</b>					<b>Rp570,585,586</b>

#### Biaya Pemasangan

No	Personil	Waktu	Biaya
1.	6 orang	1 hari	Rp15.000.000

#### Rincian Harga Keseluruhan

No.	Produk	Harga
1.	Pembuatan patung	Rp570,585,586
2.	Biaya pemasangan	Rp15,000,000
3.	PPN 11%	Rp64,414,414
<b>Grand Total</b>		<b>Rp650,000,000</b>

#### Catatan:

1. Harga ex factory.
2. Free pembuatan modeling.
3. Proses produksi akan dimulai setelah DP dibayarkan.
4. Cara pembayaran dibagi menjadi 3 termin:
  - a. Pembayaran I : Down Payment 20%
  - b. Pembayaran II : Down Payment 70% sebelum pengiriman
  - c. Pembayaran III : Pelunasan 10% setelah terpasang

Bank Detail :

CENAIIDIA BANK BCA

Dokumen penawaran scan, file asli sudah dikirim ke cv wbu



Tirto, RT 006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul D.I. Yogyakarta 55184  
Office : (0274) 281 7863 E-mail : pttimboel@gmail.com  
Show Room : (0274) 646 3615 magistyo@pttimboel.com  
WA : 085712851773 NPWP : 21.132.897.6-543.000

### Penawaran Patung Manusia Purba

Kepada

Yth,

PPK Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Terpadu  
Kabupaten Sragen tahap 3  
di tempat.

Salam sehat, terkait dengan diskusi awal untuk pembuatan patung manusia purba. Sesuai gambar referensi terlampir, berikut kami sampaikan penawarannya :

Nama	Foto Referensi	Ukuran	Finishing	Material	Harga
Manusia purba monumental		Tinggi 400 cm	Black Silver TP	Aluminum	Rp593,200,000
<b>Total</b>					<b>Rp570,585,586</b>

#### Biaya Pemasangan

No	Personil	Waktu	Biaya
1.	6 orang	1 hari	Rp15.000.000

#### Rincian Harga Keseluruhan

No.	Produk	Harga
1.	Pembuatan patung	Rp570,585,586
2.	Biaya pemasangan	Rp15,000,000
3.	PPN 11%	Rp64,414,414
<b>Grand Total</b>		<b>Rp650,000,000</b>

#### Catatan:

1. Harga ex factory.
2. Free pembuatan modeling.
3. Proses produksi akan dimulai setelah DP dibayarkan.
4. Cara pembayaran dibagi menjadi 3 termin:
  - a. Pembayaran I : Down Payment 20%
  - b. Pembayaran II : Down Payment 70% sebelum pengiriman
  - c. Pembayaran III : Pelunasan 10% setelah terpasang


4

Dokumen penawaran untuk PPK Sragen, file asli sudah dikirim ke kantor pemda sragen

Foto-foto pemasangan





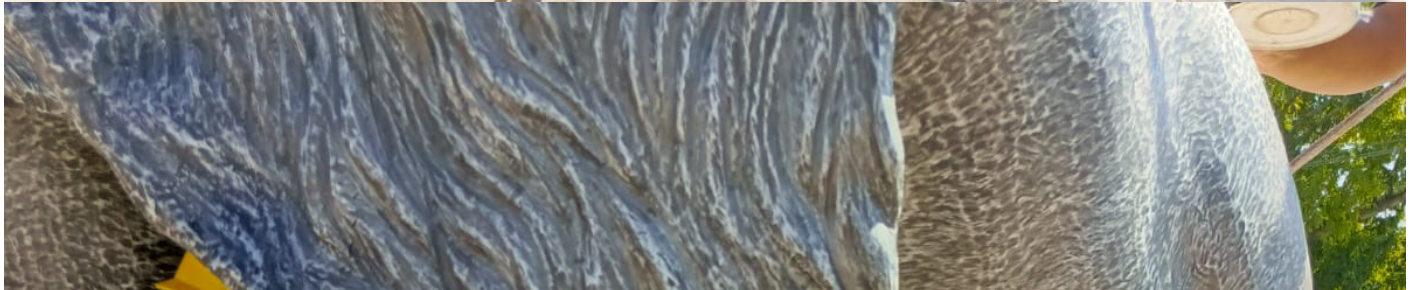







contoh: # (foto, 3d model, gambar lapangan, pdf)

---

Revisi #80

Dibuat 6 September 2025 09:06:12 oleh nyana pintaka

Diperbaharui 22 Mei 2026 01:51:37 oleh nyana pintaka
