

# Putri Duyung GRC\_Ali Hanafi (Pembayaran)

```
---
nama: putriduyung_alihanafi
type: custom_order # custom_order | perintah_kerja | pengembangan
status: progress # baru | progress | selesai
dibuat: YYYY-MM-DD
deadline: YYYY-MM-DD # deadline di tentukan oleh penerima proyek
---
```

## Ringkasan Adiksimba

- apa: Membuat Patung Duyung dari GRC
- dimana: Kediaman Pak Ali (Purikembang Jakarta)
- kapan: 29 Oktober 2025
- siapa: Livia (082210105888) dan Bu Medi (arsitek). Kustian (penghubung Pak Timbul ke Ali Hanafi), Pak Yance (staff finishing item Timboel Ali hanafi) (+62 816-892-839)
- mengapa: Mengisi kekosongan tembok bagian kolam renang Pak Ali
- bagaimana: GRC unfinished (dicat sendiri), pemasangan di tempat oleh Timboel

## Checklist

- Pembuatan model skala penuh Putri Duyung
- Persiapan logistik pemasangan putri duyung (transportasi, kru, pemasangan di lokasi)
- Jadwal ulang pemasangan Base dan Frame dan Jadwalkan berangkat tangga 8 November
- Marketing:** Mendatangkan Pak Yance ke Timboel at least 16-12-2025 dan sebelum Natal. Bujet 10 juta.
  - TIMBOEL: Minta tolong dari Aprima dan Pak Yance untuk mempersiapkan berikut:
    - Contoh barang yang kualitas standar Aprima
    - Sharing metode pengerjaan untuk putri duyung Ali Hanafi

- Jadwalkan ulang tanggal pengiriman (Marketing)
  - [ ] Jadwalkan ulang pengiriman dan pemasangan untuk Januari 2026 karena Pak Yance masih menggarap frame
    - Katanya lukis pak yance selesai sekitarr tanggal 13-1-2026
    - Timeline Pak Yance 2.5 minggu setelah pembayaran finishing Timboel
    - Menghitung kebutuhan mendatangkan Pak Yance
      - Info dari Purchasing:** Sisa dana 125jt, terhitung per 11 november. Mbak Murti: maks pengeluaran tambahan 28 juta (dikurangi revisi Pak Yance), bujet mendatangkan Pak Yance 10 jt maks (estimasi kasar)
    - Pak Qirun: mbijikke barang sudah bisa. Lebih baik mbijikke permukaan saat masih di fase abu-abu sekarang, bukan pas selesai cat.
    - Notes Pot Versaille
      - Dumpal pot
        - (Naufan) beberapa detail dikurangi dari dumpal potnya karena tertutup bahan penghalus dan dapat menambah lama proses penghalusan. detail yang dikurangi adalah detail minor seperti aksen garis, relief simpel dan dangkal.
      - (NAUFAN URGENT) minta acuan hasil pekerjaan Pak Yance karena butuh acuan standar untuk mengetahui hasil akhir yang baik seeperti apa
  - (Marketing) Update info roda ke Bu Livia pakai text dari Naufan Produksi

## Jadwal

- Bu Livi mampir ke Model 24 dan 25 September 2025
- Pak Konpres (supplier lisplang) tanggal 3 November akan mampir ke sini
- Deadline 5 November 2025
- Deadline mundur karena adanya complain engenai tingkat kehalusan permukaan
- Pemasangan Base dan frame tanggal 7 Nov
  - berangkat pemasangan tanggal 8 November, lead Margono
- Pemasangan Mermaid dan pot belum ditentukan tanggalnya karena menunggu konfirmasi Pak Yance, setelah Pak Yance selesai. Pak Yance DP tanggal 14 November 2025 estimasi 2,5 minggu dari DP, yaitu 2 Desember 2025.
  - Proses produksi
    - Menggunakan dempul plastik sunpolac sesuai anjuran Pak Yance
  - Follow up info Bu Livi tentang roda pot (19/11/2025). Bu Livi mau pakai roda hidup agar bebas bergerak, tinggi kurang lebih 5cm. Pakai rodanya mas Magis bisa.

- Bu Livia minta pengiriman diundur jafi awal Januari.
- PER Marketing, Bu Livia minta tanggal 20-21 Januari untuk dikirim ke Kembangan
- 9-12-2025 Kontak Pak Yance untuk minta penilaian hasil yang sekarang per 8-12-2025
  - Katanya oke, tapi baru mau kasih input setelah lihat barangnya langsung
- Next shipping dan pemasangan tanggal 22-24 Januari 2026.
- 24 Januari 2026 patung mermaid terpasang sempurna di kediaman pak Ali.

## Hasil rapat

### Pak Qirun, Tim finishing 9-1-2026

- List yang ada di pot miring, jadi perlu diganti
- mengganti berarti melepas, melepas berarti merusak, jadi perlu beli list tambahan (12 meter)

### Diskusi 1330 5-1-2026

- Jadinya ngecat Nippe Glossy White ke patung duyung akan digarap saat Pak Yance di lokasi karena untuk menunjukkan before after dari catnya
- Naufan ngabari Mas Supri untuk hal ini

### Diskusi Sofia dan Naufan 18-12-2025

Pak Yance setuju akan ke Jogja tanggal 29 Desember 2025, karena setelah natalan di luar negeri.

### Diskusi kunjungan pak Yance 06-12-2025

- Mermaid sudah ok, pak Yance bersedia touch up tipis-tipis on the spot di rumah pak Ali jika ada bagian yang kurang ok.
- Untuk pot dan base kotak perlu diaplikasikan sunpolac lagi lalu di amplas halus, lanjut dicat nipe putih gloss. Setelah dicat akan kelihatan bagian yang kurang ok.
- Bagian garis dan lengkungan dimaksimalkan kerapihannya.
- Bagian-bagian yang menjadi titik pusat perhatian mata sebaiknya dirapihkan lagi, diratakan, dan dihaluskan lagi.

# Diskusi 1330 15-12-2025

## Usul Pak Yance untuk dibawa ke sini untuk QC hasil dempul Timboel

- Mendatangkan Pak Yance untuk cek hasil dempul Produksi dan verifikasi hasilnya.
- Minta tolong Pak Yance untuk sharing metode finishing apabila diperlukan
- Budget maks adalah 28 juta (per Mbak Murti dan Mbak Wahyu 15-12-2025), estimas penggunaan (Naufan dan Mbak Murti) 10 juta.

# Meeting Marketing 2025-12-12

- Hasil diskusi marketing dan produksi : Timboel mengundang Pak Yance untuk datang ke Timboel untuk memeriksa kehalusan patung, karena sebelumnya Pak Yance sebagai pembuat keputusan. Budget mengundang Pak Yance maksimal 10jt masih aman.

# Diskusi 1330 2025-11-18

- Naufan standby untuk komunikasi dengan Ali Hanafia lewat WA marketing

## Hasil Diskusi Mas Margono dengan Pak Chandra (staffnya pak Kustian/pemborong)

- jalur kabel untuk lampu di base kerang akan digarapkan pemborong listrik/lampunya

# Hasil review pasca pasang 2025-11

## Permukaan base kerang dan frame set


- permukaan dari base kerang tidak sesuai keinginan Pak Yance dan Bu Livi
- Diputuskan kalau Timboel menanggung biaya revisi permukaan di Pak Yance sebesar 22 juta.
- Timeline pengerjaan 2.5 minggu setelah DP

## Komplain tambahan

- ketinggian antar base kerang berbeda 4 cm. Naufan menyampaikan ke Bu Livia bahwa ada keuntungan pemasangannya berjauhan atau tidak bersebelahan. Perbedaan 4cm tidak akan begitu terlihat, sehingga tidak masalah.



- Bulatan base kerang kanan dan kiri berbeda

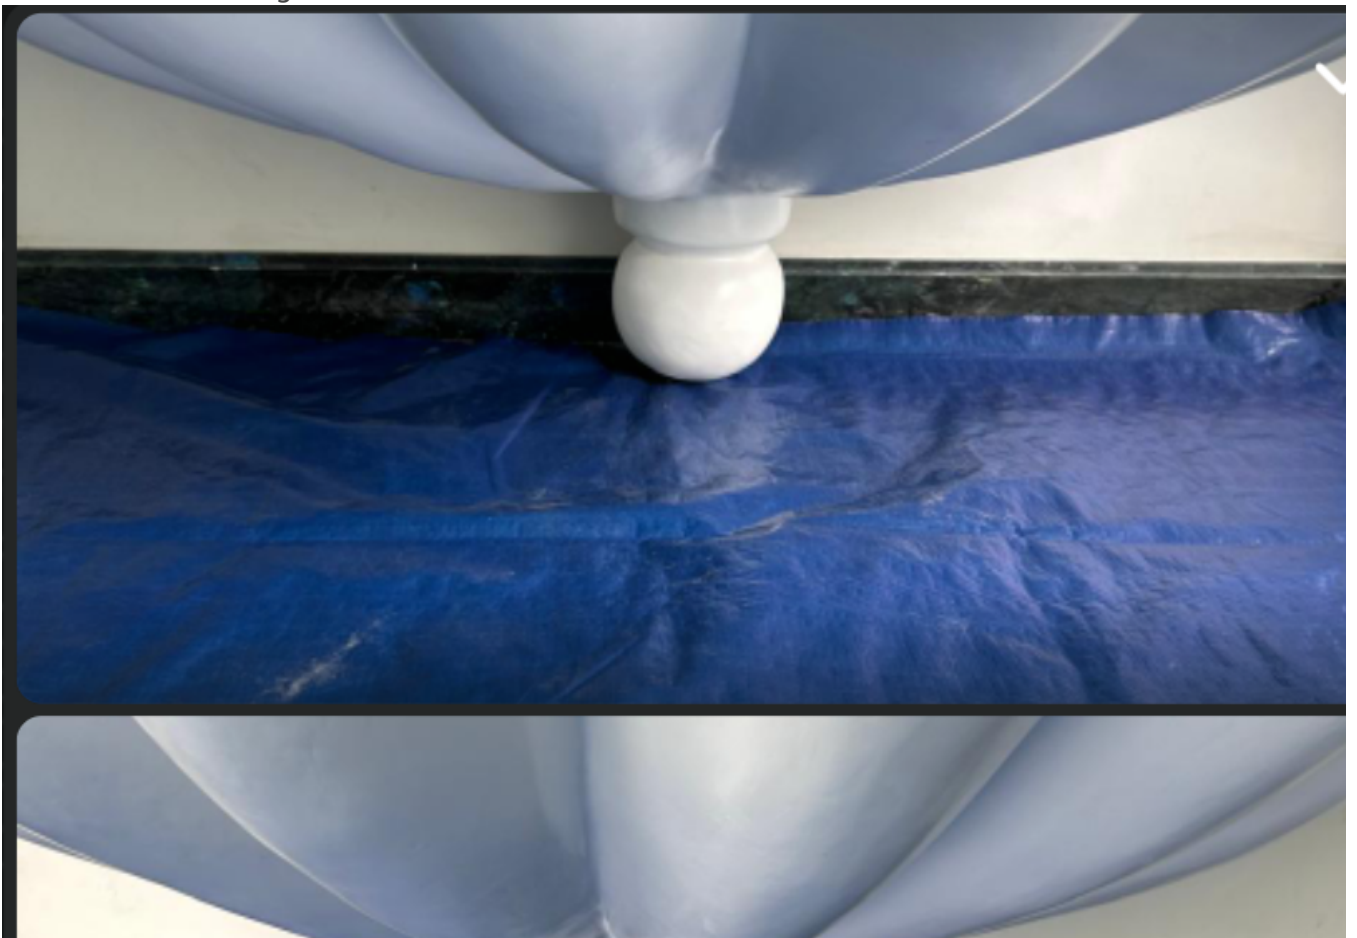

- Alasannya karena kemarin pecah saat pemasangan sehingga perlu dibuat ulang di lokasi

## Rapat 1330 2025-11-03

- Produksi minta mundur pengiriman karena produksi duyung resin selesai tanggal 8 November
- Kemungkinan tidak sampai deadline. Besok panggil Magis untuk QC.

## Rapat 27 10 2025 dengan Pak Yance

- Pakai cat finihsing nippe white glossy untuk dasaran tim Pak Yance
- frame maiden pakai papan grc, didempul sambungannya dengan dempul sanoplac.
- semua bagian difinish nipe white glossy kecuali papan grc maiden frame karena akan digarap oleh Pak Yance dan tim

## Rapat 19-08-2025

- pose mermaid jgn terlalu frontal, lebih berlekuk sesuai sketch
- panjang & besaran tangan di proporsikan dengan badan
- badan & panggul di proposikan (mock up ini panggul agak kebesaran)
- bagian perut direvisi
- untuk bentuk buntut yg sekarang sudah ok (tidak usah ikut sketch)
- rambut dibuat lebih bagus
- untuk frame lebih detail & ornamen frame (atas) dibuat lebih 3D
- concern kami untuk beratnya kira2 brp kg ya? Apakah aman untuk dibuat melayang. Mohon diutamakan safety nya.

## Hasil kunjungan 25-09-2025


- Potong Bagian belakanag jadi 1 meter, +/- potong 10cm
  - Tangan dikurangi 5cm, masing2 dimasukkan karena space terlalu mepet dengan jendela
  - Anting & Gelang dihilangkan, kalung diganti style Europe krn saat ini terlalu jawa
  - Bagian ekor dikasih sirip! Transisi biar ga kayak papak
  - Sabuk ilang diganti sirip double
  - Dengkul diperkecil
  - Pangkal ekor dikecilkan
  - Mata prior 25 sep 2025
-

- Simulasikan lampu, model lampu nunggu bu livia konfirm
- Simulasi dinabolt min beban 400

- 
- Penambahan salur diornamen kanan kiri bawahnya bunga (Bag A) Utama
  - Tambahkan garis di li
  - Lekukan luar sesuai referensi yg dikirim, tdk sesuai gambar ref dari pak Kustian gpp
  - Backingan GRC nunggu konfirmasi
  - Dicariin pedestal setinggi contoh untuk foto satu set bersama mermaid
  - Belakang kerang dibuat tdk full GRC, diberi bibir(Offset) agar masangnya bs mepet tembok
  - *style berubah dari tanaman jadi kerang & Ombak laut*
  -

# Lampiran

- Rapat 19-08-2025

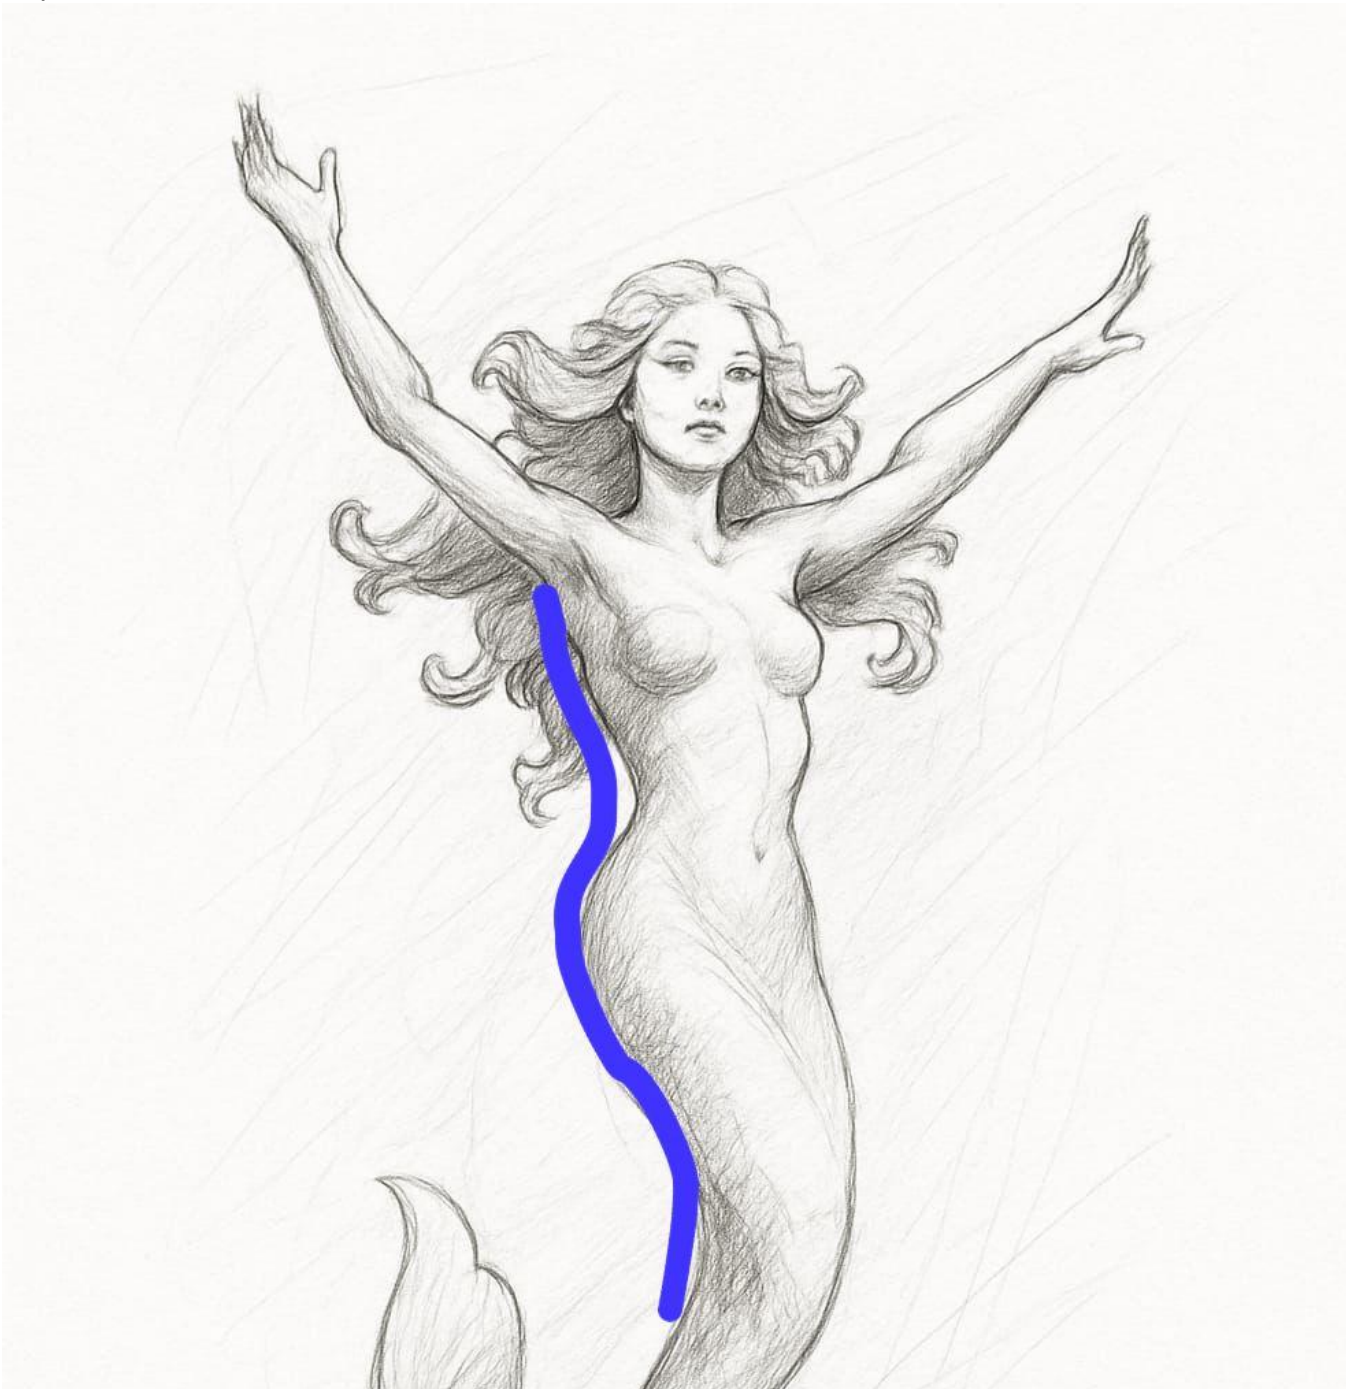

Note Hasil Kunjungan



Pagi Ibu 09.45

ya pak 09.45 ✓✓

Ini permukaannya jelek bngt 09.45

iya kmaren masih dirapihin pak 09.45 ✓✓

setau sy masih di revisi 09.45 ✓✓

Gelombang sekali 09.46

iya kmaren ud kita komplain 09.46 ✓✓

You  
setau sy masih di revisi

Baik2 ibu 09.46



---

Revisi #54

Dibuat 2 September 2025 07:08:57 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 16 Maret 2026 02:54:12 oleh fadhilanaufan
